


DICIEMBRE(Avance de Obra)



Fachada Norte:
Aplanados en Fachada: Detallando

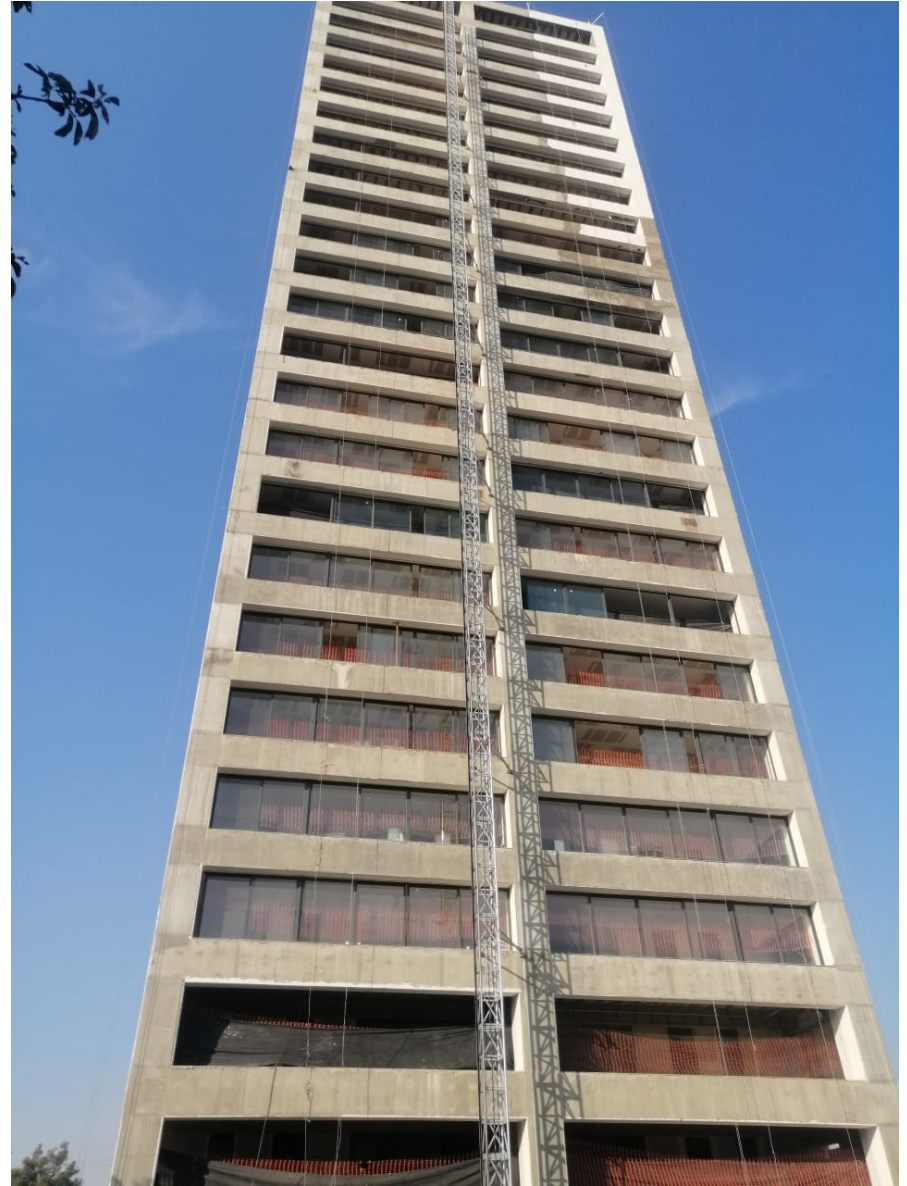

Fachada Sur
Aplanados en Fachada: 9% Avance

TRABAJOS EN FACHADA (noviembre)



Fachada Poniente:
Pintura en Fachada: Finalizado



Fachada Oriente:
Aplanados en Fachada: Detallando

FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (noviembre)



Planta Baja Lobby



Exterior Plazoleta- Terraza



Escalera a Sótano 1



Escalera Sótano 2 y 3



Sótano 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA



Porcelanato en Pisos (Nivel 15)



Porcelanato en Regaderas (Nivel 10)



Avance de Obra:

- *Aplanados Nivel 24
- *Firmes Detallando
- *Porcelanato:
 - Pisos: Niveles 3 al 16
 - Baños: Nivel 3 al 10
- *Escaleras: Detallando
- *Impermeabilización:
 - Boquillas: Pendiente Nivel 01
 - Baños, Lavado, HVAC: Niveles 3 al 16
 - Terrazas: Nivel 23



Porcelanato Lobby (Nivel 12)

AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA



Muros de Tablaroca (Nivel 23)



Tablaroca en Plafones (Nivel 15)



Tablaroca (Nivel 15)

Avance de Obra:

*Muros de Tablaroca

Nivel 23

*Metales en Plafón

Nivel 23

*Tablaroca en Plafón

Nivel 15

*Pasta

Nivel 15



Pasta en Muros y Plafones (Nivel 15)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA



Pararrayos



Ducteria Eléctrica Muros (Nivel 19)

Avance de Obra:

- *Ductos en Losa
- *Ductos en Muro
- *Cableado
- *Inst. Accesorios y Luminarias

- Nivel 22
- Nivel 19
- Nivel 15
- Nivel 03



Cableado (Disparos) (Nivel 15)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ESPECIALES Y EXTRACCIÓN



Extracción Aire Caliente (Nivel 23)



Extracción Baños(Nivel 23)

Avance de Obra:

Especiales:

*Cableado Voz y Datos

Nivel 3 al 13

*Contra Incendios:

Nivel 3 al 13

Extracción:

*Baños:

Nivel 3 al 22

*Aire Caliente:

Nivel 3 al 23



Salidas Contra Incendios (Nivel 13)


AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDROSANITARIA Y GAS



Inst. Calentador (Nivel 6)



Inst. Hidráulica (Nivel 23)

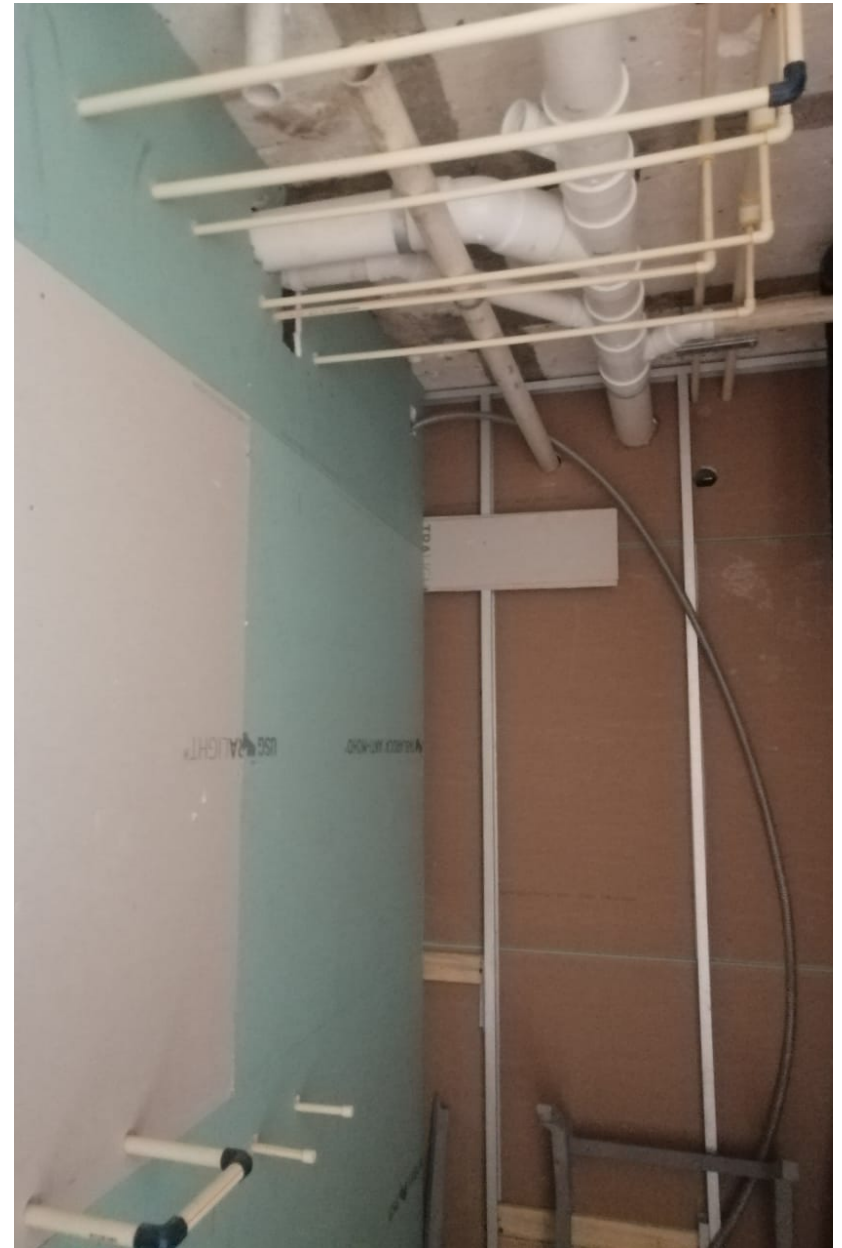

Inst. Sanitaria (Nivel 23)

Avance de Obra:

*Instalación Hidráulica

*Instalación Sanitaria

*Instalación de Gas:

*Inst. Accesorios y
Muebles de Baño

Nivel 23

Nivel 23


Pruebas

Nivel 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO



Canceles Corredizos

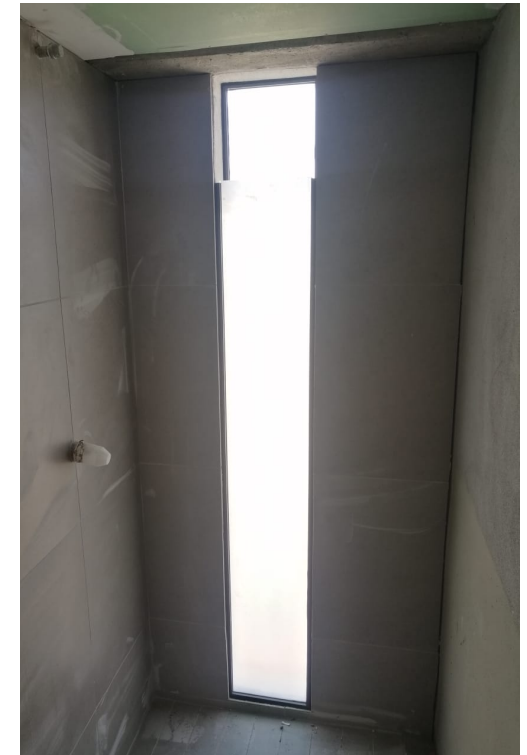

Ventana Sifón (Nivel 03)

Avance de Obra:

- *Instalación Ventanas y Louvers Pendiente Nivel 01
- *Instalación Cancel Corredizo Nivel 03 al 14
- *Instalación Ventana Sifón Nivel 10



Cancel Corredizo (Nivel 14)


AVANCE FOTOGRÁFICO CARPINTERÍA, COCINA y Piso laminado



Cocina LUNA Nivel 4



Cocina BOSQUE Nivel 3

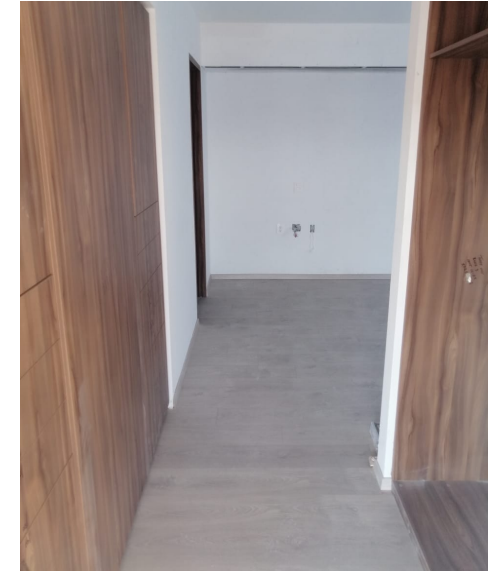

Piso Laminado (Nivel 3)

Avance de Obra:

Instalación:

*Muebles (Closet y Bajo Lavabo)

*Puertas

*Cocinas:

Nivel 05

Nivel 04

Producción:

*Cocinas:

*Muebles y Puertas:

Niveles 3 al 6

Niveles 3 al 7



Closet Nivel 5

AVANCE FOTOGRÁFICO PINTURA Y PISO LAMINADO



Pintura Nivel 7


Avance de Obra:

*Pintura Departamentos

Nivel 07

*Piso Laminado

Nivel 03

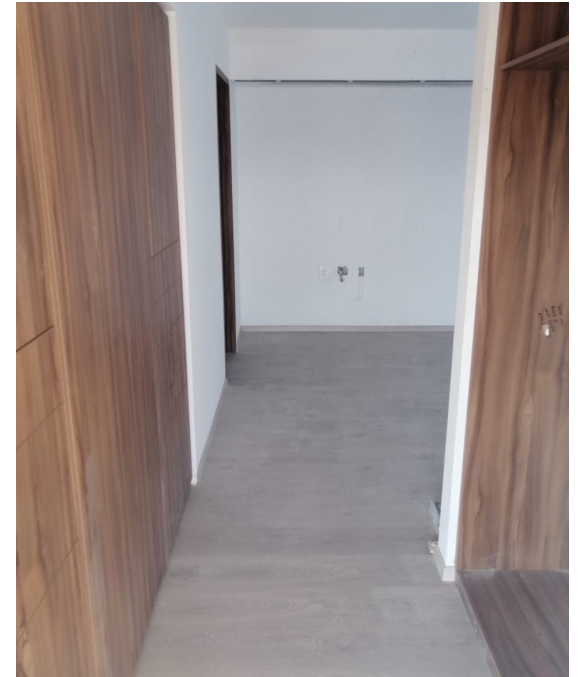

Piso Laminado Nivel 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ELEVADOR



Cabina Elevador




Botoneras

Avance de Obra:

- *Instalación Rieles:
- *Instalación Puertas:
- *Instalación de Soportes
- *Fabricación de cabina
- *Botoneras

Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Nivel 12

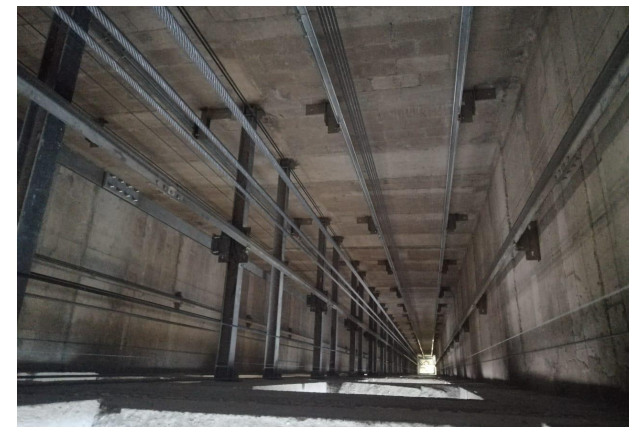

Puertas de Elevador (Nivel 24)

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 24



PH 01

Nivel 23



Bosque

Nivel 22



Bosque



PH 02



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 21



Bosque

Nivel 20



Bosque

Nivel 19



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 18



Bosque

Nivel 17



Bosque

Nivel 16



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 15



Bosque

Nivel 14



Bosque

Nivel 13



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 12



Bosque

Nivel 11



Bosque

Nivel 10



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 09



Bosque

Nivel 08



Bosque

Nivel 07



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 06



Bosque

Nivel 05



Bosque

Nivel 04



Bosque



Luna



Luna



Luna

AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 03



Bosque

Nivel 02



Bosque

Nivel 01



101



Luna



Luna



102
