NOVIEMBRE(Avance de Obra)



Fachada Norte: Aplanados en Fachada: 90% Avance



Fachada Sur Aplanados en Fachada: 7% Avance

TRABAJOS EN FACHADA (noviembre)



Fachada Poniente: Pintura en Fachada: 50% Avance



Fachada Oriente: Aplanados en Fachada: Detallando

FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (noviembre)



Planta Baja Interior



Escalera a Sótano 1



Exterior




Escalera Sótano 2 y 3



Sótano 3

AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA









Porcelanato en Regaderas (Nivel 7)

Avance de Obra:

* <u>Aplanados</u>	Detallando
* <u>Yeso</u>	Nivel 24
*Firmes	Detallando

*Porcelanato:

Pisos: Niveles 3 al 16 Baños: Nivel 3 al 7

*Cubo de Escaleras: Detallando *Escaleras Detallando



Porcelanato en Pisos (Nivel 15)

AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA





Tablaroca en Plafones (Nivel 15)

Pasta en Muros y Plafones (Nivel 15)

Avance de Obra:

*Muros de Tablaroca	Nivel 23
*Metales en Plafón	Nivel 20
*Tablaroca en Plafón	Nivel 15

*Pasta Nivel 15



Muros de Tablaroca (Nivel 23)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA



Inst. Luminarias (Nivel 03)

Avance de Obra:

*Ductos en Losa	Nivel 22
*Ductos en Muro	Nivel 18
*Cableado	Nivel 15
*Inst. Accesorios y Luminarias	Nivel 03

Inst. Eléctricas en Losa (Nivel 21)



Cableado (Disparos) (Nivel 15)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ESPECIALES Y EXTRACCIÓN



Extracción Aire Caliente (Nivel 15)

Avance de Obra:

Especiales:

*Cableado Voz y Datos Nivel 3 y 4
*Contra Incendios: Nivel 3 al 10

Extracción:


*Baños: Nivel 3 al 20 *Aire Caliente: Nivel 3 al 15





Salidas Contra Incendios (Nivel 10)

AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDROSANITARIA Y GAS

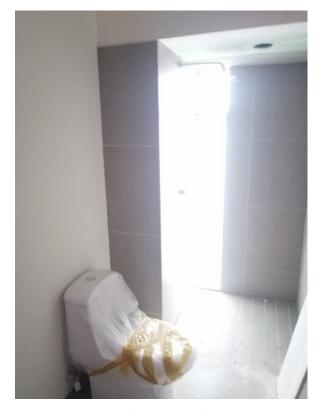

Inst. WC (Nivel 3)

AROCA ANTI-MOHO

Inst. Sanitarias (Nivel 21)

Avance de Obra:

*Instalación	Hidráulica
*Instalación	Sanitaria

^{*}Instalación de Gas:

Nivel 20

Nivel 21

Pruebas





Inst. Hidráulicas (Nivel 20)

^{*}Inst. Accesorios y Muebles de Baño

AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO



Canceles Corredizos

Ventana Sifón (Nivel 03)

Avance de Obra:

*Instalación Ventanas y Louvers

*Instalación Cancel Corredizo

*Instalación Ventana Sifón

Pendiente Nivel 01

Nivel 03 al 13

Nivel 03



Cancel Corredizo (Nivel 13)

AVANCE FOTOGRÁFICO CARPINTERÍA, COCINA y Piso

laminado







Cocina Tipo LUNA

Cocina Tipo BOSQUE

Piso Laminado (Nivel 3)

Avance de Obra:

Instalación:

*Muebles (Closet y Bajo Lavabo)

*Puertas

*Cocinas: Nivel 03

*Piso Laminado Nivel 03

Producción:

*Cocinas: Niveles 3 al 6 *Muebles y Puertas: Niveles 3 al 7



Mueble de TV

AVANCE FOTOGRÁFICO IMPERMEABILIZACION



Nivel 06 Impermeabilizante Cuarto Lavado



Nivel 04 Impermeabilizante Regadera

Avance de Obra:

*Imper. en Boquillas Pendiente Nivel 01

*Imper. Terrazas Nivel 19


*Baño, Cuarto de Lavado y HVAC

Niveles 3 al 11



Nivel 16 Impermeabilizante en Terraza

AVANCE FOTOGRÁFICO ELEVADOR

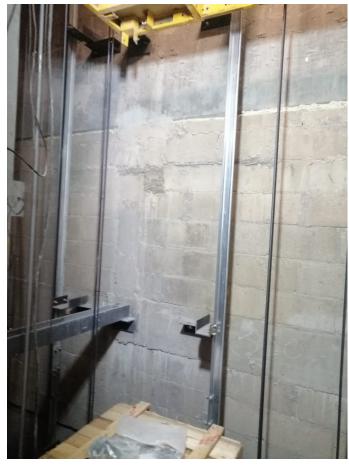

Chasis de Cabina Elevador

Avance de Obra:

- *Instalación Rieles:
- *Instalación Puertas:
- *Instalación de Soportes
- *Fabricación de cabina

Finalizado Finalizado Finalizado En Proceso




Rieles Cubo de Elevador



Puertas de Elevador (Nivel 24)

Nivel 24 Nivel 23 Nivel 22



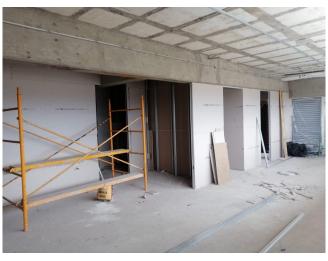



PH 01 Bosque Bosque







PH 02 Luna Luna

Nivel 21 Nivel 20 Nivel 19







Bosque Bosque Bosque







Nivel 18 Nivel 17 Nivel 16







Bosque Bosque







Nivel 15 Nivel 14 Nivel 13







Bosque Bosque Bosque







Nivel 12 Nivel 11 Nivel 10







Bosque Bosque Bosque







Nivel 09 Nivel 08 Nivel 07







Bosque Bosque Bosque







Nivel 06 Nivel 05 Nivel 04







Bosque Bosque Bosque







Nivel 03 Nivel 02 Nivel 01







Bosque Bosque 101







Luna Luna 102
